VALTER DANTAS GOMES DOS SANTOS

ID	Trabalho	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Nomes de Recursos
1		**Escola Básica Guilherme Stephens – Implementação de espaço de jogo e recreio destinado aos alunos dos 3º e 4º anos – Marinha Grande**	**45 dias**	**Seg 01-06-15**	**Qua 15-07-15**	
2	**1**	**MOVIMENTOS DE TERRAS**	**4 dias**	**Seg 01-06-15**	**Qui 04-06-15**	
3	**1.1**	Retirada de elementos vegetais localizados na área de intervenção	4 dias	Seg 01-06-15	Qui 04-06-15	
4	**1.2**	Retirada de cepos localizados na área de intervenção	4 dias	Seg 01-06-15	Qui 04-06-15	
5	**1.3**	Saneamento de raízes existentes	4 dias	Seg 01-06-15	Qui 04-06-15	
6	**1.4**	Escavação e aterro na modelação de plataforma a intervir de acordo com os pavimentos a aplicar e cotas finais de projeto, incluindo carga, transporte e descarga de produtos sobrantes em operador certificado para tratamentos destes resíduos, todos os traba	4 dias	Seg 01-06-15	Qui 04-06-15	
7	**2**	**PAVIMENTOS**	**40 dias**	**Sex 05-06-15**	**Ter 14-07-15**	
8	**2.1**	**LANCÍS**	**5 dias**	**Sex 05-06-15**	**Ter 09-06-15**	
9	**2.1.1**	Fornecimento e aplicação de lancil-guia em betão, espelho de 8 cm, na delimitação do espaço de jogo e recreio e de circulação pedonal, incluindo fundação em betão ciclópico, todos os trabalhos e materiais.	5 dias	Sex 05-06-15	Ter 09-06-15	
10	**2.2**	**CIRCULAÇÃO PEDONAL**	**5 dias**	**Qua 10-06-15**	**Dom 14-06-15**	
11	**2.2.1**	Execução de sub-base de agregado britado de granulomentria extensa (ABGE) com 10cm de espessura, após rega e compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais.	5 dias	Qua 10-06-15	Dom 14-06-15	
12	**2.2.2**	Execução de pavimentos em lajetas de betão 20cm x 10cm x 5cm, em cinza à cor natural, em áreas de circulação pedonal associadas ao espaço de jogo e recreio, assente em almofada de pó de pedra com 6cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais.	5 dias	Qua 10-06-15	Dom 14-06-15	
13	**2.3**	**PAVIMENTO SINTÉTICO**	**30 dias**	**Seg 15-06-15**	**Ter 14-07-15**	
14	**2.3.1**	Execução de sub-base de agregado britado de granulomentria extensa (ABGE) com 10cm de espessura, após rega e compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais.	5 dias	Seg 15-06-15	Sex 19-06-15	
15	**2.3.2**	Execução de betonilha afagada, com 0,07m de espessura como base para aplicação de pavimento sintético, respeitando nas cotas de fixação dos equipamentos existentes, todos os trabalhos e materiais.	5 dias	Sáb 20-06-15	Qua 24-06-15	
16	**2.3.3**	Fornecimento e aplicação de pavimento sintético em borracha, com 60mm de espessura, aplicado em módulos de 0,50m x 0,50m, incluindo cola, respeitando as cotas de fixação dos equipamentos de jogo e recreio a instalar, todos os trabalhos e materiais.	10 dias	Dom 05-07-15	Ter 14-07-15	
17	**3**	**EQUIPAMENTOS**	**10 dias**	**Qui 25-06-15**	**Sáb 04-07-15**	
18	**3.1**	**Fornecimento e aplicação de mobiliário urbano e equipamento de jogo e recreio, do tipo "Carmo" ou equivalente, incluindo fixação, acessórios, todos os trabalhos e materiais:**	**1 dia**	**Qui 25-06-15**	**Qui 25-06-15**	
19	**3.1.1**	Bancos de jardim com costas, ref.º.2030, ou equivalente, incluindo maciço em betão com elemento de reforço dentro do maciço através do prumo.	1 dia	Qui 25-06-15	Qui 25-06-15	
20	**3.2**	Fornecimento e montagem de equipamento de jogo e recreio, do tipo "Torre Boomerang" ref.º 1370, da Carmo ou equivalente, destinado a 38 utilizadores em simultâneo e altura máxima de queda livre de 1,90 metros, incluindo maciços de fixação, todos os trabal	10 dias	Qui 25-06-15	Sáb 04-07-15	
21	**3.3**	Fornecimento e aplicação de vedação em madeira tratada constituída por módulos de 1.5m de altura, 1.0m de altura visível depois de cravados, do tipo "texana plus", ref.º. 2221, da "Carmo", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais.	2 dias	Sex 03-07-15	Sáb 04-07-15	
22	**3.4**	Fornecimento e montagem de painel informativo em madeira tratada, dimensões 125x70x250 cm, do tipo "Golf - Placard informativo" ref.º 2390, da Carmo ou equivalente, incluindo impressão de material de divulgação em vinil a cores (de acordo com os element	1 dia	Sáb 04-07-15	Sáb 04-07-15	
23	**4**	**DRENAGEM**	**1 dia**	**Sáb 04-07-15**	**Sáb 04-07-15**	
24	**4.1**	Fornecimento e aplicação de grelha em ferro fundido 2.0x0.75m, incluindo trabalhos prévios no canalete de suporte para instalação da grelha ao nível do pavimento confinante, todos os trabalhos e materiais.	1 dia	Sáb 04-07-15	Sáb 04-07-15	
25	**5**	**DIVERSOS**	**1 dia**	**Qua 15-07-15**	**Qua 15-07-15**	
26	**5.1**	Entrega de telas finais em formato digital.	1 dia	Qua 15-07-15	Qua 15-07-15	

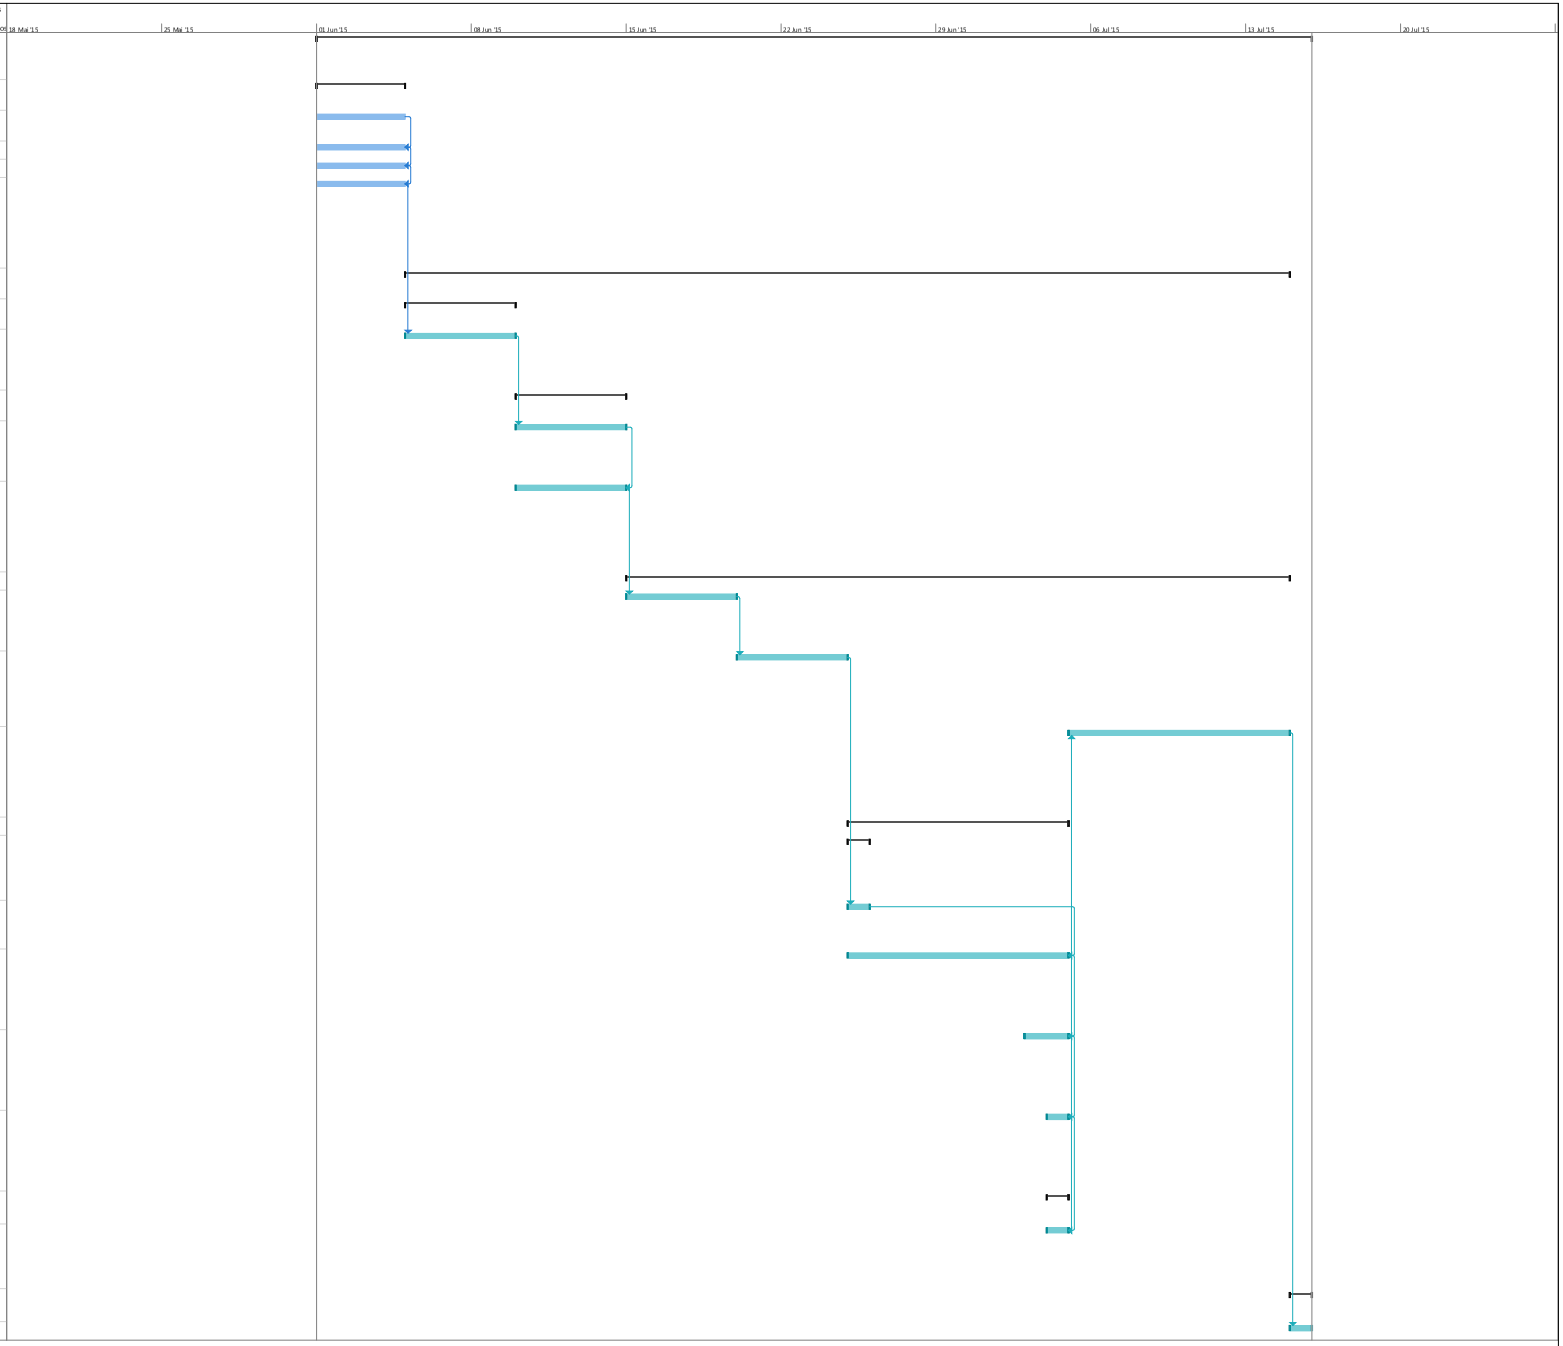

Projeto: Marinha grande1
Data: Ter 28-04-15

Tarefa · Dividir · Marco · Sumário · Resumo de Projeto · Tarefa Inativa · Marco Inativo · Resumo Inativo · Tarefa Manual · Apenas duração · Resumo da Agregação Manual · Resumo Manual · Apenas início · Apenas conclusão · Tarefas Externas · Marco Externo · Prazo · Progresso · Progresso Manual
