DONO DE OBRA: Município da Marinha Grande

PLANO DE TRABALHOS

EMPREITADA: "Remodelação da rede de abastecimento de água e rede de rega no largo Gago Coutinho e Sacadura Cabral"

Prazo de Execução da Empreitada 30 Dias

Item	Cód	Actividade	Duração	Início	Conclusão	Custo
1		**PRAZO GLOBAL**	**30 dias**	**01-06-15**	**30-06-15**	**18.026,01 €**
2		Assinatura do Contrato	0 dias	01-06-15	01-06-15	
3		Aprovação do PSS	0 dias	01-06-15	01-06-15	
4		**CORPO TÉCNICO**	**30 dias**	**01-06-15**	**30-06-15**	
5		CONSIGNAÇÃO	0 dias	01-06-15	01-06-15	
6		RECEPÇÃO PROVISÓRIA	0 dias	30-06-15	30-06-15	
7						
8		**Estaleiro**	**30 dias**	**01-06-15**	**30-06-15**	
9		**Execução de montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, adequado à natureza dos trabalhos a executar e à dimensão da obra, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento**	**30 dias**	**01-06-15**	**30-06-15**	
10		a) Montagem de estaleiro	2 dias	01-06-15	02-06-15	
11		b) Manutenção de Estaleiro	27 dias	03-06-15	29-06-15	
12		c) Desmontagem de Estaleiro e limpeza da área e arranjo paisagístico do espaço ocupado	1 dia	30-06-15	30-06-15	
13						
14		Implementação e acompanhamento das Normas e Regulamentos em vigor sobre Plano de Segurança e Saúde	30 dias	01-06-15	30-06-15	
15		Implementação e orientações do Plano da Qualidade	30 dias	01-06-15	30-06-15	
16		Implementação e orientações do P.Gestão Ambiental e e R.C.C.D.	30 dias	01-06-15	30-06-15	
17						
18		**EMPREITADA**	**30 dias**	**01-06-15**	**30-06-15**	**18.026,01 €**
19	**1**	**LARGO GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL**	**30 dias**	**01-06-15**	**30-06-15**	**18.026,01 €**
20	**1.1**	**BY-PASS**	**24 dias**	**03-06-15**	**26-06-15**	**1.176,00 €**
21	1.1.1	Execução de by-pass para abastecimento de água a todos os edificios habitados, durante a execução dos trabalhos.	24 dias	03-06-15	26-06-15	1.176,00 €
22	**1.2**	**CONDUTA EXISTENTE**	**21 dias**	**05-06-15**	**25-06-15**	**4.698,29 €**
23	**1.3**	**NOVA CONDUTA**	**7 dias**	**19-06-15**	**25-06-15**	**1.155,00 €**
24	**1.4**	**RAMAIS**	**15 dias**	**11-06-15**	**25-06-15**	**3.176,50 €**
25	**1.5**	**BOCA DE INCÊNDIO**	**2 dias**	**21-06-15**	**22-06-15**	**450,00 €**
26	**1.6**	**ACESSÓRIOS**	**18 dias**	**08-06-15**	**25-06-15**	**2.720,00 €**
27	**1.7**	**REDE DE REGA**	**12 dias**	**18-06-15**	**29-06-15**	**1.850,22 €**
28	**1.8**	**DIVERSOS**	**30 dias**	**01-06-15**	**30-06-15**	**2.800,00 €**
29	1.8.1	Prospecção de cabos telefónicos e de outras infraestruturas existentes (redes de Águas Residuais, Rede de Abastecimento de Água, Rede de Gás, Rede Eléctrica e outras).	15 dias	01-06-15	15-06-15	2.550,00 €
30	1.8.2	Realização de testes e ensaios, com entrega de telas finais em formato DGN ou DXF, Projeção - Transverse Mercator Datum - ETRS89, Elipsóide - GRS80, com os temas divididos por níveis, devidamente separados por tipo, diâmetro, material e outras caracterís	9 dias	22-06-15	30-06-15	250,00 €

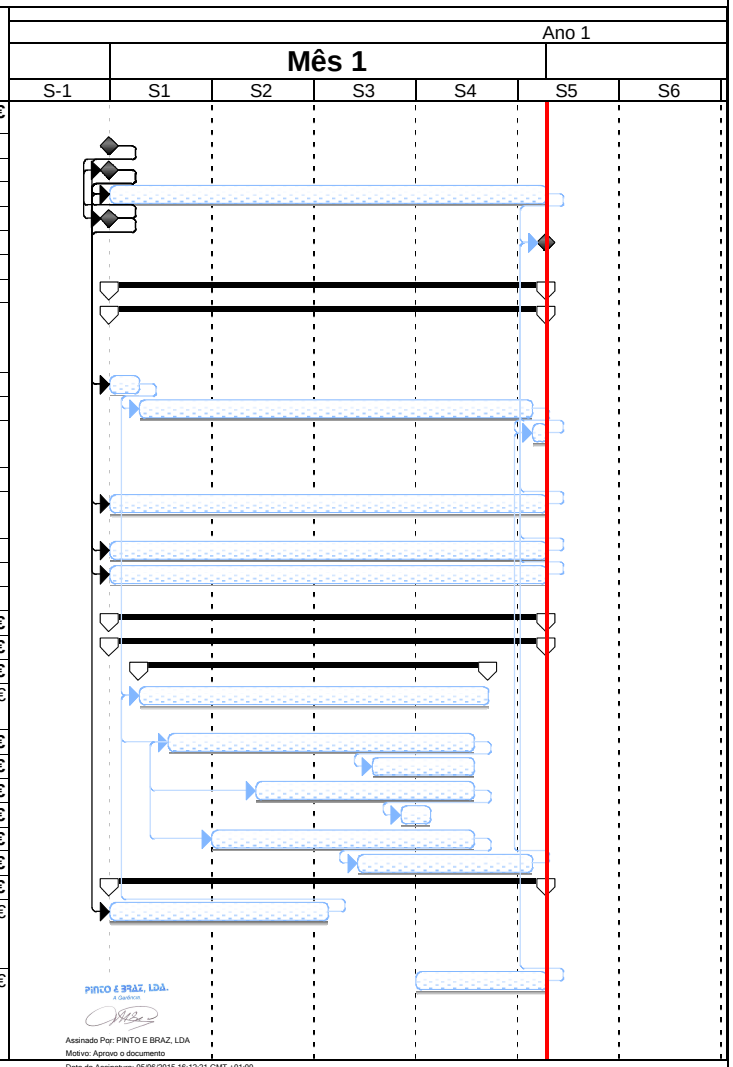

PINTO & BRAZ, LDA.
A Gerência
Assinado Por: PINTO E BRAZ, LDA
Motivo: Aprovo o documento
Data da Assinatura: 05/06/2015 16:12:21 GMT +01:00

ACTIVIDADE NORMAL — FOLGA PARA RECUPERAÇÃO — Folga Livre

DURAÇÃO POR CAPÍTULO — ocorrencia

Barracão, 04 de Junho de 2015
