CONSÓRCIO FORMADO POR: GARFIVE LDA E JOSE MANUEL PINHEIRO MADALENO LDA

PLANO DE TRABALHOS

Prazo = 90 dias

Requalificação da Cobertura dos Edificios do Estaleiro Municipal

ID	Artigo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Predecessoras
1		**Requalificação da Cobertura dos Edificios do Estaleiro Municipal**	**90 dias**	**Ter 01/09/15**	**Dom 29/11/15**	
2		CONSIGNAÇÃO*	0 dias	Ter 01/09/15	Ter 01/09/15	
3	1	DESMATAÇÃO E DECAPAGEM	1 dia	Ter 01/09/15	Ter 01/09/15	2
4	2	DEMOLIÇÕES	30 dias	Qua 02/09/15	Qui 01/10/15	3
5	3	REVESTIMENTOS	55 dias	Qui 17/09/15	Ter 10/11/15	6II+5 dias
6	4	ESTRUTURAS METÁLICAS	45 dias	Sáb 12/09/15	Seg 26/10/15	4II+10 dias
7	6	DRENAGEM PLUVIAL	24 dias	Sex 06/11/15	Dom 29/11/15	8CI-15 dias
8	7	CAIXILHARIAS	80 dias	Qua 02/09/15	Sex 20/11/15	4II

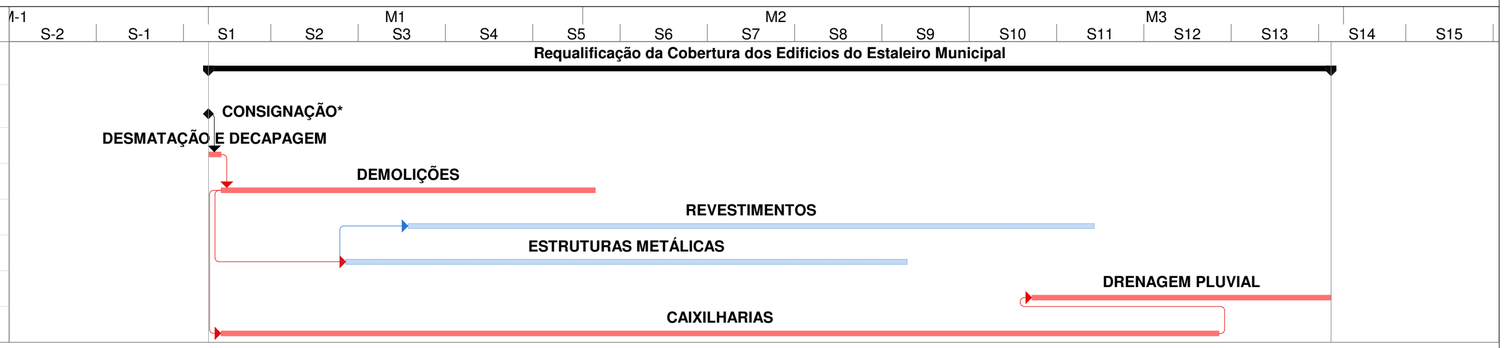

GAR-FIVE, LDA

Assinado de forma digital por GAR-FIVE, LDA
DN: c=PT, ou=Certificate Profile - Qualified Certificate - Representative, ou=Terms of use at https://www.digitalsign.pt/ECDIGITALSIGN/rpa, ou=Entitlement - ASSINAR EM PLATAFORMAS ELECTRONICAS DE CONTRATACAO, ou=Address1 - ZONA INDUSTRIAL DO FUNDAO LOTE 154 MACB E1 E8, ou=PostalCode - 6230-348, ou=Representative Name - SERGIO QUELHAS MESQUITA, ou=Representative ID - CC 18093054, cn=GAR-FIVE, LDA, email=geral@garfive.com
Dados: 2015.08.25 17:51:24 +01'00'

Crítica		Tarefa		Tarefa Manual		Apenas-duração		Marco da Linha Base	◇	Sumário		Tarefas Externas		Marco Inactivo	◇
Divisão Crítica		Dividir		Apenas início	[	Linha Base		Marco	◆	Resumo Manual		Marco Externo	◆	Resumo Inactivo	
Progresso Crítico		Progresso da Tarefa		Apenas-conclusão	]	Divisão da Linha Base		Resumo do Progresso		Resumo de Projecto		Tarefa Inactiva		Prazo	↓

* Data Indicativa deverá ser actualizada após indicação do Dono de Obra;
